



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 01		MÊS 01		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)				
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - MEIO PERÍODO - 110H/MÊS (220%)	34,34%	R\$ 15.647,83	32,98%	R\$ 15.028,52	32,98%	R\$ 15.028,52	67,02%	R\$ 30.539,48
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	33,33%	R\$ 6.814,94	33,33%	R\$ 6.814,94	33,33%	R\$ 6.814,94	66,67%	R\$ 13.629,87
1.3	MESTRE DE OBRA - PERÍODO INTEGRAL - 220H/MÊS	50,00%	R\$ 619,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.238,63
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EM CAVALETE DE MADEIRA - CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	33,33%	R\$ 7.835,49	33,33%	R\$ 7.835,49	33,33%	R\$ 7.835,49	66,67%	R\$ 15.670,98
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	100,00%	R\$ 378,09	100,00%	R\$ 378,09	100,00%	R\$ 378,09	0,00%	R\$ 0,00
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5M³	91,93%	R\$ 2.180,08	62,80%	R\$ 1.489,18	62,80%	R\$ 1.489,18	37,20%	R\$ 882,19
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5M³	50,00%	R\$ 191,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 382,58
2.3	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO	100,00%	R\$ 990,61	100,00%	R\$ 990,61	100,00%	R\$ 990,61	0,00%	R\$ 0,00
2.4	REMOÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO	100,00%	R\$ 498,57	100,00%	R\$ 498,57	100,00%	R\$ 498,57	0,00%	R\$ 0,00
2.5	REMOÇÃO DE PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO	100,00%	R\$ 261,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 261,34
2.6	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE FORMA MECANIZADA, COM APROVEITAMENTO - ESTACIONAMENTO	100,00%	R\$ 102,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 102,93
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 135,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 135,34
3.1	DIVISÓRIAS LEVES	100,00%	R\$ 6.224,97	84,18%	R\$ 5.239,92	84,18%	R\$ 5.239,92	15,82%	R\$ 985,05
3.2	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M		R\$ 4.695,76	100,00%	R\$ 4.695,76	100,00%	R\$ 4.695,76	0,00%	R\$ 0,00
3.3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLO INTERNA, ESPESSURA FINAL 125 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,75 M		R\$ 544,16	100,00%	R\$ 544,16	100,00%	R\$ 544,16	0,00%	R\$ 0,00
3.4	PAREDE DE GESSO ACARTONADO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, ESPESSURA FINAL 125 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,75 M		R\$ 795,76	100,00%	R\$ 795,76	100,00%	R\$ 795,76	0,00%	R\$ 0,00
4	ESQUADRIAS		R\$ 189,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 189,29
4.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	46,02%	R\$ 95.081,16	3,44%	R\$ 7.116,57	3,44%	R\$ 7.116,57	96,56%	R\$ 199.508,03
4.1	PM 70X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 70X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		R\$ 707,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 707,34
4.2	PM 80X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 80X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		R\$ 26.632,40	12,97%	R\$ 3.455,01	12,97%	R\$ 3.455,01	87,03%	R\$ 23.177,39
4.3	PM 90X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 90X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANEL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		R\$ 16.925,29	12,17%	R\$ 2.060,47	12,17%	R\$ 2.060,47	87,83%	R\$ 14.864,82
4.4	PM 180X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 180X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		R\$ 15.069,84	1,67%	R\$ 251,16	1,67%	R\$ 251,16	98,33%	R\$ 14.818,68
4.5	PM 180X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 180X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		R\$ 3.201,66	33,33%	R\$ 1.067,22	33,33%	R\$ 1.067,22	66,67%	R\$ 2.134,44
4.6	PM 180X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 180X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		R\$ 1.413,53	20,00%	R\$ 282,71	20,00%	R\$ 282,71	80,00%	R\$ 1.130,82
4.7	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM		R\$ 1.948,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.948,46
4.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - SALA DE PERÍCIA		R\$ 1.948,46	0,30%	R\$ 0,00	0,30%	R\$ 0,00	99,70%	R\$ 1.948,46

CONSTRUTORA DOTTOLIDA
Paulo Rogério Datto



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		SALDO	
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
4.8	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TRILHOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - DIMENSÕES APROXIMADAS 160X180CM - AFERRI MEDIDAS NO LOCAL.	100,00%	R\$ 2.344,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.344,13
4.9	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PA (180X350)CM - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - FIXO/ABRIR, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS E ACESSÓRIOS - INSTALADA	100,00%	R\$ 8.164,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.164,29
4.10	PAV - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 60X180X3 - COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS E FECHADURA (REF: PAPAIZ OU SIMILAR) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - 4 UNIDADES	100,00%	R\$ 1.650,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.650,59
4.11	PAV - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 90X210X3 (1,89MF), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS E FECHADURA (REF: PAPAIZ OU SIMILAR)	100,00%	R\$ 722,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 722,12
4.12	PAVCX-ALÇAPÃO AL - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, UTILIZAR EM CADA ACESSO, 0,80X2,10, COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS E TRINCO COM CADEDO (REF: PAPAIZ OU SIMILAR) (ACESSO RESERVATÓRIO SUPERIOR)	100,00%	R\$ 1.283,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.283,78
4.13	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, UTILIZAR RESERVATÓRIO DE INCENDIO, 1,0X1,60 M COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS E TRINCO COM CADEDO (REF: PAPAIZ OU SIMILAR)	100,00%	R\$ 611,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 611,33
4.14	PCF - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015, 90X210X3 (1,89MF), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS E FECHADURA (REF: PAPAIZ OU SIMILAR) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	100,00%	R\$ 3.401,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.401,02
	JANELAS COMUNS EM ALUMÍNIO						
4.15	JA (60X60)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 6MM - 12 UNIDADES	100,00%	R\$ 738,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 738,69
4.16	JA (70X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO JATEADO INCOLOR 5MM	100,00%	R\$ 94,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 94,40
4.17	JA (90X60)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 5MM	100,00%	R\$ 184,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 184,67
4.18	JA (90X90)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 5MM	100,00%	R\$ 415,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 415,50
4.19	JA (90X180)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 5MM	100,00%	R\$ 554,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 554,02
4.20	JA (180X90)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 5MM	100,00%	R\$ 831,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 831,02
4.21	JA (180X180)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 5MM	100,00%	R\$ 3.878,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.878,09
4.22	JA (180X350)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 5MM. JANELAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO DUPLO - PERFS COM PREENCHIMENTO EM ISOLAMENTO ACUSTICO	100,00%	R\$ 4.308,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.308,99
4.23	JA (60X60)CM - FORNECER E INSTALAR AS PARTES MÓVEIS DAS ESQUADRIAS, PERFS DE ALUMÍNIO PARA SISTEMA STRUCTURAL GLAZING, INCLUINDO BRAÇOS DE ABERTURA E TRINCO COMPATIVELIS COM A LINHA, OS VIDROS SÃO LISOS INCOLOR DUPLO 5MM - TOTAL 10 MM. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	0,00%	R\$ 4.290,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.290,14
4.24	JA (90X90)CM - FORNECER E INSTALAR AS PARTES MÓVEIS DAS ESQUADRIAS, PERFS DE ALUMÍNIO PARA SISTEMA STRUCTURAL GLAZING, INCLUINDO BRAÇOS DE ABERTURA E TRINCO COMPATIVELIS COM A LINHA, OS VIDROS SÃO LISOS INCOLOR DUPLO 5MM - TOTAL 10 MM. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	0,00%	R\$ 4.826,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.826,40
4.25	JA (90X180)CM - FORNECER E INSTALAR AS PARTES MÓVEIS DAS ESQUADRIAS, PERFS DE ALUMÍNIO PARA SISTEMA STRUCTURAL GLAZING, INCLUINDO BRAÇOS DE ABERTURA E TRINCO COMPATIVELIS COM A LINHA, OS VIDROS SÃO LISOS INCOLOR DUPLO 5MM - TOTAL 10 MM. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	0,00%	R\$ 14.479,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.479,20
4.26	JA (180X180)CM - FORNECER E INSTALAR AS PARTES MÓVEIS DAS ESQUADRIAS, PERFS DE ALUMÍNIO PARA SISTEMA STRUCTURAL GLAZING, INCLUINDO BRAÇOS DE ABERTURA E TRINCO COMPATIVELIS COM A LINHA, OS VIDROS SÃO LISOS INCOLOR DUPLO 5MM - TOTAL 10 MM. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	0,00%	R\$ 77.222,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 77.222,44
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS						
4.27	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - JA (180X350)CM - SEÇÃO 20X30MM (ESPESURA DA CHAPA 1,11MM) - QUADRO EM SEÇÃO 60X60MM (ESPESURA DA CHAPA 1,55) - ACABAMENTO EM FUNDO ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DORIC WHITE - INSTALADO COM PARAFUSOS NAS ALVENARIAS DENTRO DOVÃO - DO LADO INTERNO À ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 10.725,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.725,26
5	FORRO	0,00%	R\$ 5.154,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.154,88



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		SALDO	
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
5.1	COMPLEMENTOS DE FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - COM PELÍCULA VINÍLICA BRANCA, APOIADOS EM PERRIS METÁLICOS TIPO "T" - SUSPENSOS POR PENOURAS RÍGIDAS (COMPRIMENTO: 0,65 M / ESPESSURA: 12,5 MM / LARGURA: 0,65 M) - INSTALADO, INCLUSIVE ACABAMENTOS DE BORDA E ACESSÓRIOS	0,81%	R\$ 5.154,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.154,88
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	0,27%	R\$ 1.712,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.712,70
6.1	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA - ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 - PREPARO MANUAL - APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES - ESPESURA 20MM. (DIVISÓRIAS NOVAS)	0,27%	R\$ 1.712,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.712,70
7	RODAPÉS E PISOS	2,23%	R\$ 14.267,14	18,97%	R\$ 2.706,14	18,97%	R\$ 11.561,00
7.1	RODAPÊ EM POLIURETANO - REFERÊNCIA TÉCNICA: SANTA LUZIA MODERNA 478 - 15MM X 50CM X 2,40M (BARRA) BRANCO, FIXADO SOBRE CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE (TODO O IMÓVEL)	2,20%	R\$ 14.054,14	19,26%	R\$ 2.706,14	80,74%	R\$ 11.348,00
7.2	SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO - PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, CONFORME PADRÃO APLICADO NO LOCAL, NAS ADEQUAÇÕES DURANTE A REFORMA	0,03%	R\$ 213,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 213,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,97%	R\$ 12.586,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.586,30
8.1	REDE DE ÁGUA FRIA						
	TUBOS - INCLUSIVE CONEXÕES						
8.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC - DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF - 12/2014	0,03%	R\$ 214,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 214,47
8.1.2	REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO						
8.1.2	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA CROMADA - ACABAMENTO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,12%	R\$ 758,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 758,96
8.1.3	REGISTROS - PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO						
8.1.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,01%	R\$ 84,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 84,32
8.2	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO						
	POINTOS DE ÁGUA E ESGOTO						
8.2.1	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 50 MM - LAVATÓRIOS	0,05%	R\$ 323,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 323,93
	CAIXAS						
8.2.2	FORNECER E INSTALAR GRELHA EM CAIXA SIFONADA EXISTENTES, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.						
8.3	SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA						
8.3.1	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA USO GERAL 3/4" - REFERÊNCIA TÉCNICA: STANDARD 39 CR 1153 - DECA OU SIMILAR - (TORNEIRA DE JARDIM)	0,05%	R\$ 333,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 333,80
8.4	LOUÇAS						
8.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2013	0,16%	R\$ 1.003,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.003,43
8.5	METAIS						
8.5.1	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - UMA POR SANITÁRIO	0,12%	R\$ 796,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 796,01
8.5.2	PENSADEIRO PARA PAPEL TOALHA, LINHA STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UMA POR SANITÁRIO E COPA	0,14%	R\$ 895,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 895,91
8.5.3	ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO, E=5 MM COM BISOTE DE 1,5CM - FIXADO COM 04 (QUATRO) BOTES CROMADOS NAS BORDAS (Ø 60X100) - INSTALADO JUNTO A CADA LAVATÓRIO. 20 UNIDADES	0,30%	R\$ 1.937,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.937,68
8.5.4	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - REFERÊNCIA TÉCNICA: TORNEIRA LAVATÓRIO USO PÚBLICO MESA PRESSMATIC ALFA CR 446106 - DOCOL OU SIMILAR - FECHAMENTO AUTOMÁTICO OU SIMILAR (LAVATÓRIO INDIVIDUAIS PÚBLICOS)	0,04%	R\$ 273,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 273,13
8.5.5	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - EM INOX ESCOVADO 54 CM X 40 CM (NO LAVATÓRIO PNE)	0,50%	R\$ 3.192,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.192,36
8.5.6	CHUVEIRO TIPO DUCHA - ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220 V - 5400 W	0,03%	R\$ 190,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 190,29



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)		%		CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	MÊS 01	MÊS 01	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
8.5.7	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 32 MM (1.1/4") OU 40 MM (1.1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCOL SALVÁGUA CROMADO 451106 - BOTAÇÃO DE DUPLO AÇIONAMENTO (PNE)	R\$ 1.042,57	0,16%	R\$ 1.042,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.042,57	100,00%
8.5.8	ACABAMENTO DE DESCARGA PARA VASO ADAPTADOS PNE - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCOL SALVÁGUA CROMADO 451106 - BOTAÇÃO DE DUPLO AÇIONAMENTO (PNE PÚBLICO - DOIS SERVIDORES) REF. BENEFIT	R\$ 1.309,09	0,20%	R\$ 1.309,09	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.309,09	100,00%
9	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 29.722,53	4,64%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 29.722,53	100,00%
	REDES - TESTE DO SISTEMA												
9.1	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, QUENTE/FRIO, SISTEMA INVERTER - 30.000 BTU/H	R\$ 5.468,73	0,85%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.468,73	100,00%
9.2	REVISÃO E TESTE NAS REDES FRIGORÍGENAS EXISTENTE E TESTE DO SISTEMA - COM APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R410	R\$ 3.629,91	0,57%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.629,91	100,00%
	EQUIPAMENTOS - BDI DIFERENCIADO												
9.3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 30.000 BTU/H - SISTEMA INVERTER - REFERÊNCIA TÉCNICA: FUJITSU OU SIMILAR - QUENTE/FRIO (PREVISÃO 11 UNIDADES IMÓVEL, PARA O TRT SOMENTE 6 UNIDADES)	R\$ 20.490,04	3,20%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20.490,04	100,00%
9.4	RELOCAR UM EQUIP. JÁ INSTALADO - CASO FALTE NO ESPAÇO UTILIZADO PELO TRT/CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 42.000 BTU/H - SISTEMA INVERTER	R\$ 133,85	0,02%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 133,85	100,00%
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 3.506,93	0,55%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.506,93	100,00%
10.1	INSTALAÇÃO DE BOMBAS - CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 65 (2 1/2") E DN RECALQUE 50 (2")	R\$ 1.811,81	0,28%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.811,81	100,00%
10.2	AÇIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES	R\$ 685,44	0,11%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 685,44	100,00%
10.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO 4 KG, CLASSE ABC	R\$ 868,87	0,14%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 868,87	100,00%
10.4	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SOMENTE INSTALAÇÃO	R\$ 140,81	0,02%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 140,81	100,00%
11	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 23.881,76	3,73%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.881,76	100,00%
	SERVIÇOS INTERNOS AO TERRENO												
	PAISAGISMO												
11.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS OU ROLO - INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO	R\$ 1.081,25	0,17%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.081,25	100,00%
11.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M	R\$ 863,43	0,13%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 863,43	100,00%
11.3	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M.	R\$ 605,40	0,09%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 605,40	100,00%
	CAÇADAS												
11.4	PLACA CIMENTÍCIA PODOTÁTIL 40 X 40 CM, E = 3,5 CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA	R\$ 1.098,51	0,17%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.098,51	100,00%
	SERVIÇOS EXTERNOS AO TERRENO - PASSEIO												
	CAÇADAS												
11.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	R\$ 11.276,08	1,76%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.276,08	100,00%
11.6	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.	R\$ 4.771,73	0,75%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.771,73	100,00%
11.7	PLACA CIMENTÍCIA PODOTÁTIL 40 X 40 CM, E = 3,5 CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA	R\$ 3.785,26	0,59%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.785,26	100,00%
	RAMPAS ACESSO PNE - REBAIXO DA CALÇADA												
11.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	R\$ 19,16	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19,16	100,00%
11.9	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	R\$ 380,94	0,06%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 380,94	100,00%
12	PINTURAS	R\$ 37.404,11	5,84%	-	0,00%	R\$ 4.763,23	12,73%	R\$ 4.763,23	12,73%	R\$ 4.763,23	87,27%	R\$ 32.640,88	87,27%
	PINTURA EM MUROS												
12.1	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, (CONSIDERADO 1 DEMÃO - 60% DA COMP.)	R\$ 5.067,76	0,79%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.067,76	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS												
12.2	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS - (SOMENTE ESPAÇO TRT - CONSIDERADO 1 DEMÃO - 60% DA COMP.)	R\$ 4.183,94	0,65%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.183,94	100,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				MÊS 01		MÊS 01		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
12.3	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS PINTURA LATEX AGRÍCOLA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO - (CONSIDERADO 1 DEMÃO - 60% DA COMP.)	R\$ 7.859,73	1,23%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.859,73
12.4	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO - PORTAS NA COR BRANCO ACETINADO	R\$ 8.573,61	1,34%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.573,61
12.5	PINTURA EM METAL LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS - GRADIL	R\$ 4.040,79	0,63%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.040,79	100,00%	R\$ 4.040,79	0,00%	R\$ 0,00
12.6	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO - APLICADO NO GRADIL DE FECHAMENTO E NO PORTÃO DE CORRER E PARACÍCLO.	R\$ 7.224,44	1,13%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 722,44	10,00%	R\$ 722,44	90,00%	R\$ 6.502,00
12.7	PINTURA EM PISO PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 CM DE LARGURA - INCLUSIVE FAIXA ZEBRADA E DESENHO UNIVERSAL.	R\$ 399,67	0,06%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 399,67
12.8	ESCALADA MARINHEIRO PINTURA COM TINTA ALÓJDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA - POR DEMÃO - APLICADO NA ESCALADA TIPO MARINHEIRO - CONSIDERADO 1 DEMÃO	R\$ 54,17	0,01%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54,17
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES CORREÇÃO DOS BANCOS EXTERNOS EM CONCRETO - CORRIGIR AS 4 UNIDADES	R\$ 1.607,05	0,25%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.607,05
13.1	VERNZ FOLHETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, 03 DEMÃO - APLICADO EM BANCO DE CONCRETO	R\$ 183,58	0,03%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 183,58
13.2	COMUNICAÇÃO VISUAL - INSTALAR PLACAS FORNECIDAS PELO TRT (CONSIDERADO SOMENTE O ESPAÇO DO TRT)	R\$ 346,34	0,05%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 346,34
13.3	COMUNICAÇÃO VISUAL - INSTALAR LETREIRO FORNECIDAS PELO TRT - "JUSTIÇA DO TRABALHO"	R\$ 134,02	0,02%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 134,02
13.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DESLIZANTE PARA AUTOMAÇÃO DOS PORTÕES	R\$ 193,01	0,03%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 193,01
13.5	REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE FORMA MECANIZADA, RELOCAR NO ESTACIONAMENTO	R\$ 603,30	0,09%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 603,30
13.6	LIMPEZA DA OBRA LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO (SOMENTE AREA TRT)	R\$ 146,80	0,02%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 146,80
14	LIMPEZA DA OBRA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. (SOMENTE EXTERNO TRT)	R\$ 387,89	0,06%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 387,89
14.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENTRADA DE SERVIÇO EM TENSÃO PRIMÁRIA E RELATÓRIO DE ATERRAMENTO	R\$ 3.261,45	0,51%	19,46%	R\$ 44.384,41	0,00%	R\$ -	8,90%	R\$ 20.286,73	91,10%	R\$ 207.755,40
14.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INFRAESTRUTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 228.042,12	35,62%	50,00%	R\$ 4.044,39	0,00%	R\$ -	90,77%	R\$ 18.596,88	9,23%	R\$ 1.892,03
15	CABEAMENTO ELÉTRICO INTERRUPTORES E TOMADAS	R\$ 20.488,90	3,20%	20,00%	R\$ 23.630,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.488,90
15.1	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS CULUNAS TÉCNICAS, TOTENS TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	R\$ 118.151,41	18,46%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 118.151,41
15.2	QUADROS ELÉTRICOS EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	R\$ 21.148,94	3,30%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.148,94
15.3	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TELEFONIA E SONORIZAÇÃO ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 33.419,48	5,22%	50,00%	R\$ 16.709,74	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.419,48
15.4	QUADRO TELEFÔNICO E COMPLEMENTAÇÕES EM RACKS CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	R\$ 22.827,38	3,57%	0,00%	R\$ -	7,40%	R\$ 1.689,85	7,40%	R\$ 1.689,85	92,60%	R\$ 21.137,52
15.5	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO TOTAL	R\$ 948,45	0,15%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 948,45
16	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TELEFONIA E SONORIZAÇÃO ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 16.419,07	2,56%	7,00%	R\$ 1.149,81	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.419,07
16.1	CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E SONORIZAÇÃO	R\$ 857,27	0,13%	50,00%	R\$ 428,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 857,27
16.2	QUADRO TELEFÔNICO E COMPLEMENTAÇÕES EM RACKS CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	R\$ 3.605,86	0,56%	20,00%	R\$ 721,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.605,86
16.3	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO TOTAL	R\$ 3.723,87	0,58%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.723,87
16.4	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO TOTAL	R\$ 7.773,89	1,21%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.773,89
16.5	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO TOTAL	R\$ 458,17	0,07%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 458,17
17	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO TOTAL	R\$ 1.412,25	0,22%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.412,25
	TOTAL	R\$ 640.155,13		29,07%	R\$ 186.100,83		R\$ 56.669,08	8,85%	R\$ 56.669,08	91,15%	R\$ 583.486,05



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
------	-----------	-------------	---


Material: 72,84%
Mão de Obra: 27,16%

CRONOGRAMA PREVISTO	
MÊS 01	
%	VALOR (R\$)

CRONOGRAMA EXECUTADO	
MÊS 01	
%	VALOR (R\$)

ACUMULADO	
%	VALOR (R\$)
%	VALOR (R\$)

VALOR DO MATERIAL COM BDI	72,84%	R\$ 41.276,51
VALOR DA MÃO DE OBRA COM BDI	27,16%	R\$ 15.392,57
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	R\$ 56.669,08

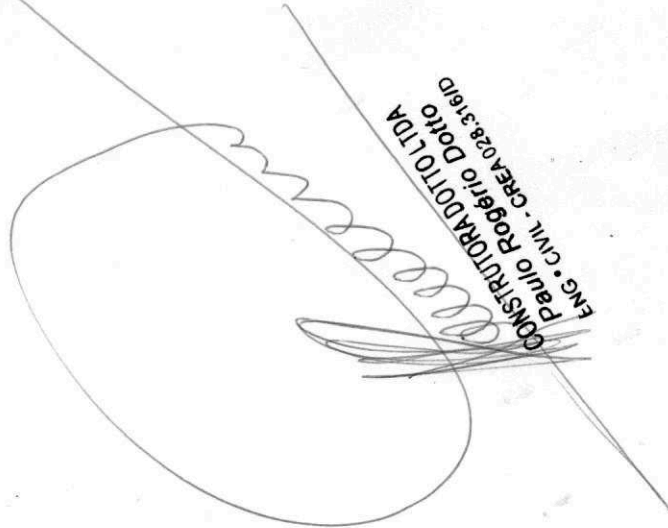

CONSTRUTORA DOTTOLDA
Paulo Rogério Dotta
ENG. CIVIL - CREA 028.318/D
