



RELATÓRIO – MEDIÇÃO 1º TERMO ADITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO – TRT 147.

CONTRATADA: CONTATO ELETROMECÂNICA LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 25/2021, PO 23/2021, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 23/09/2021 até 23/10/2021 (2 meses após início de obra).

Esta medição do 1º Termo Aditivo atingiu o valor de **R\$ 8.711,67 (Oito mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos)**, que corresponde a um percentual de 100,00% para a medição e 100,00% acumulado. Portanto, esta medição atingiu o previsto no cronograma alterado conforme solicitado através de Termo Aditivo (VETOR 99346).

A medição do 1º Termo Aditivo, conforme previsto em contrato, ocorreu dois meses após a data de início, ou seja, em 23/10/2021.

I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.

Não foram executados serviços nesta etapa.



2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Não foram executados serviços nesta etapa.

3. TRT 147 – PPCI

3.1 - DEMOLIÇÕES

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.2 – ALVENARIAS E FECHAMENTOS

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.3 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.4 – PINTURAS

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.5 – COMUNICAÇÃO VISUAL

Não foram executados serviços nesta etapa.

3.6 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Instalação de 05 unidades de blocos autônomos de iluminação de emergência, 30 leds, sobre forro modular, incluindo a retirada da luminária existente (Figura 01);



Figura 01

Total financeiro executado no item TRT 147 – PPCI – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 283,44 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 283,44 acumulado (100,00% do total em planilha)

4. TRT 147 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE FRONTAL

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (Figura 02)



Figura 02

GRELHA FLEXÍVEL HEMISFÉRICA (Figura 03)

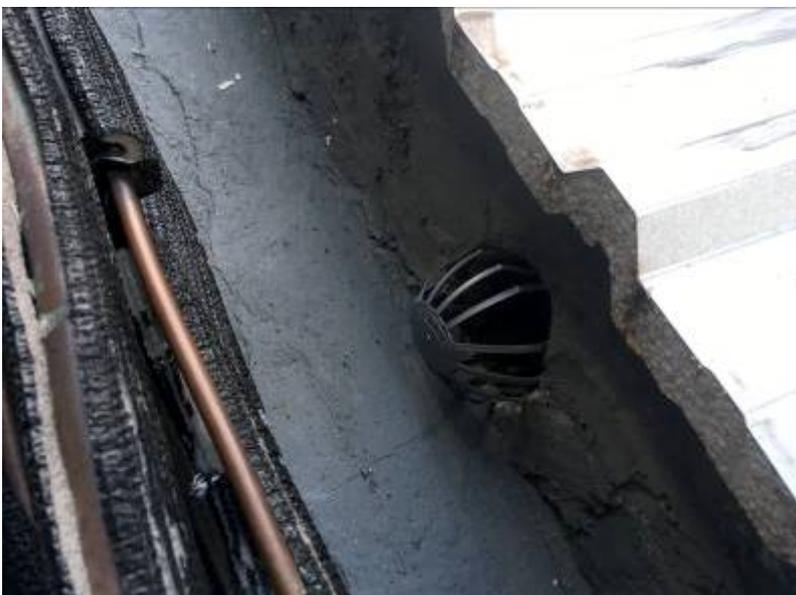


Figura 03



Total financeiro executado no item TRT 147 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE FRONTAL SALDO 2ª MEDIÇÃO	R\$ 7.133,14 na etapa (25,85% do total em planilha)
	R\$ 27.596,36 acumulado (100,00% do total em planilha)
Total financeiro executado no item TRT 147 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE FRONTAL MEDIÇÃO 1º ADITIVO	R\$ 7.045,45 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 7.045,45 acumulado (100,00% do total em planilha)
Total financeiro executado no item TRT 147 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE FRONTAL GLOSA 1º ADITIVO	-R\$ 7.134,47 na etapa (100,00% do total em planilha)
	-R\$ 7.134,47 acumulado (100,00% do total em planilha)
Total financeiro executado no item TRT 147 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE FRONTAL SALDO 1º ADITIVO	R\$ 7.044,12 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 27.507,34 acumulado (100,00% do total em planilha)

5 – TRT 147 - ACESSIBILIDADE

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DECA ECO CONFORT - DOCOL BENEFIT (PNE). (Figuras 04 e 05).



Figura 04



Figura 05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014. (Figura 06).





Figura 06

Total financeiro executado no item TRT 147 – ACESSIBILIDADE SALDO 2ª MEDIÇÃO	R\$ 601,37 na etapa (4,73% do total em planilha)
	R\$ 12.717,31 acumulado (100,00% do total em planilha)
Total financeiro executado no item TRT 147 – ACESSIBILIDADE MEDIÇÃO 1º ADITIVO	R\$ 1.384,22 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 1.384,22 acumulado (100,00% do total em planilha)
Total financeiro executado no item TRT 147 – ACESSIBILIDADE GLOSA 1º ADITIVO	-R\$ 601,48 na etapa (100,00% do total em planilha)
	-R\$ 601,48 acumulado (100,00% do total em planilha)
Total financeiro executado no item TRT 147 – ACESSIBILIDADE SALDO 1º ADITIVO	R\$ 1.384,11 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 13.500,05 acumulado (100,00% do total em planilha)



5. LIMPEZA FINAL

Não foram executados serviços nesta etapa.

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 1º Termo Aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à medição do 1º Termo Aditivo.

Curitiba, 26 de novembro de 2021.

Digite o texto aqui

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro
