

RELATÓRIO – 5ª MEDIÇÃO
(FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL E TOLEDO)

OBJETO: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO.

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO**, objeto do Contrato Nº 56/2022, PO 43/2022, VETOR 283128, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório de recebimento da quarta etapa (comissionamento) relativas aos imóveis dos Fóruns Trabalhistas de Toledo PR e Cascavel PR.

Esta 5ª medição atingiu o valor de **R\$ 45.873,84 (quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três e oitenta e quatro centavos)**, que corresponde a:

- Percentual de 10% para a medição (10% etapa 4) e 100% acumulado para o imóvel de Cascavel PR;
- Percentual de 10% para a medição (10% etapa 4) e 100% acumulado para o imóvel de Toledo PR;
- Considerando-se o total do contrato, 2,89% para a etapa e 84,26% para o total, conforme previsto no cronograma item 6.2 do edital

O comissionamento dos imóveis de Cascavel e Toledo foi concluído pela fiscalização do TRT na data de 15/05/2023, dentro do prazo estabelecido pelo 3º termo aditivo ao contrato 56/2022 25/04/2023.

I. SERVIÇOS EXECUTADOS.

I.1. COMISSIONAMENTO.

Nesta etapa a contratada finalizou os ajustes nas usinas fotovoltaicas de Cascavel e Toledo, e o comissionamento das instalações foi realizado pela fiscalização do TRT. As usinas encontram-se em pleno funcionamento conforme informações obtidas através do aplicativo de gerenciamento Solarman.



Figura 01 – Gráfico de geração do dia 14/05/23 (aplicativo Solarman) - Cascavel

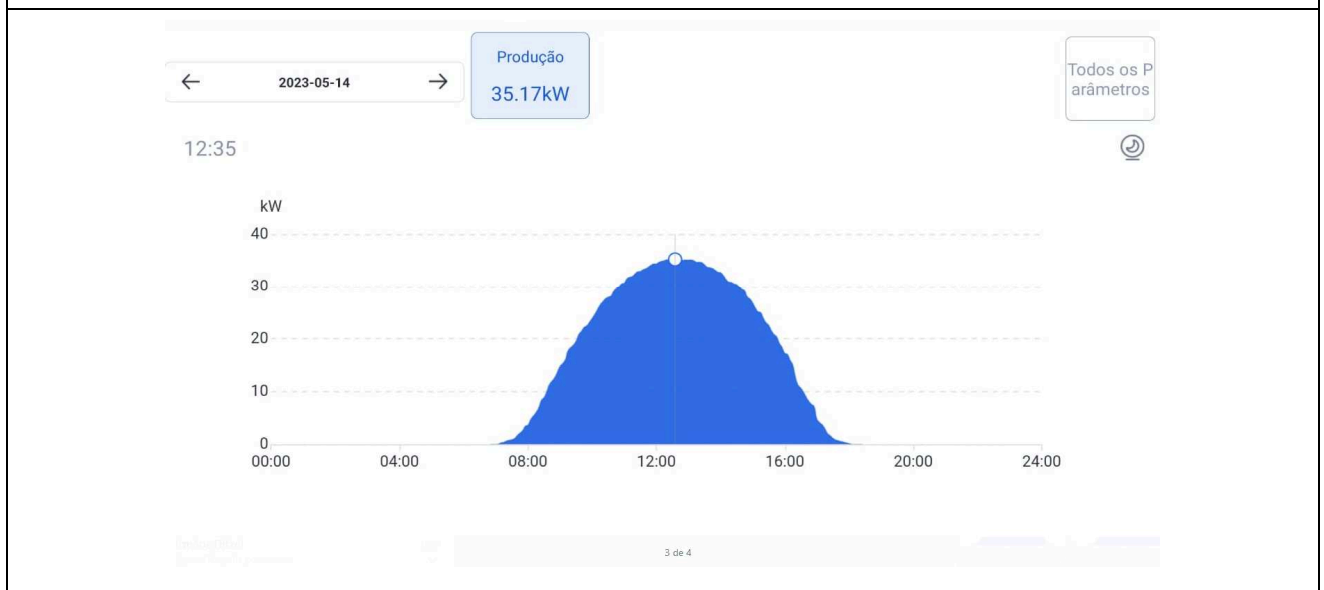


Figura 02 – Gráfico de geração do dia 14/05/23 (aplicativo Solarman) - Toledo

Total financeiro executado no item etapa 4 (FT de Cascavel e FT de Toledo)	R\$ 45.873,84 na etapa (2,89% do total em planilha)
	R\$ 1.336.087,92 acumulado (84,26% do total em planilha, para o contrato)

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 5ª medição foram executados de acordo com o especificado, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 5ª medição.

III. DOS ANEXOS

- Certidão 5ª medição
- Planilha de consolidação das medições

Curitiba, 15 de maio de 2023.

Carlos Henrique Siwek
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Heron Cazarim Marroni
Membro
